

NOTITIE

Onderwerp	Ecologisch werkprotocol voorbelasten en bouwrijp maken	
Project	Weespersluis	
Opdrachtgever	GEM Bloemendalerpolder CV	
Projectcode	119530	
Status	Definitief	
Datum	25 maart 2020	
Referentie	119530/20-004.757	
Auteur(s)	ir. 5.1.2e	
Gecontroleerd door	5.1.2e	MSc
Goedgekeurd door	5.1.2e	MSc
Paraaf	5.1.2e	
Bijlage(n)	Arbeids- en onderzoekshygiëne Schematische weergave van het gefaseerd verwijderen van het faunaschermb	
Aan	GEM Bloemendalerpolder CV	5.1.2e
Kopie	-	

1 INLEIDING

Voor het project Weespersluis voert Witteveen+Bos de ecologische begeleiding uit. Het voorliggende document betreft een ecologisch werkprotocol ten behoeve van de fasen/bouwvelden die in de komende jaren worden voorbelast en bouwrijp gemaakt. Kortgezegd houdt dit in dat op het bestaande maaiveld in de polder een zandpakket van circa 5 meter wordt aangebracht waarna dit 6 tot 12 maanden de tijd krijgt om te zetten. Het zandpakket wordt vervolgens gedeeltelijk afgegraven, waarna de riolering en nutsvoorzieningen voor de toekomstige woningen en de tijdelijke bouwwegen worden aangelegd. Er is in 2017 door Els & Linde een algemeen Ecologisch werkprotocol voor het gehele werk opgesteld. Het onderliggende werkprotocol richt zich op het voorbelasten en het bouwrijp maken en de wijze waarop gedurende deze werkzaamheden rekening dient te worden gehouden met beschermde amfibiesoorten (heikikker en rugstreeppad), in het waterlevende organismen en broedvogels.

2 STAPPEN IN FASERING ONTWIKKELING WEESPERSLUIJ

De werkzaamheden die in de komende jaren worden uitgevoerd zijn onder te verdelen in een aantal bouwfasen. Gedurende de verschillende bouwfasen dient rekening te worden gehouden met de (mogelijke) onverwachte/onvoorziene aanwezigheid van beschermde soorten. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden is een deelgebied namelijk voorzien van faunaschermen en heeft vervolgens het afvangen

De mitigerende maatregelen die op deze fase van toepassing zijn, staan beschreven in hoofdstuk 5. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels. Met name soorten als oeverwaluw, kleine plevier en scholekster nestelen in of op open zand. Tot slot is de Zorgplicht (hoofdstuk 3.3) van kracht.

2.3 Bouwrijp maken (ca. 6 maanden doorlooptijd)

Nadat een gebied ruw bouwrijp gemaakt is (en voldoet aan de restzettingseis) zal gestart worden met het bouwrijp maken. De werkzaamheden die tijdens het bouwrijp maken uitgevoerd worden zijn het aanbrengen van de riolering, het graven van nieuwe watergangen inclusief het aanbrengen van beschoeiingen (NB. deze beschoeiingen kunnen dienen als faunakering) en het aanleggen van bouwwegen.

De maatregelen die in deze fase van toepassing zijn betreffen voornamelijk die in hoofdstuk 4.3 (onderhoud faunaschermen) zijn beschreven. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels en is de Zorgplicht (hoofdstuk 3.3) van kracht.

2.4 Bouw woningen (ca. 1 jaar doorlooptijd)

Als het gebied bouwrijp is kan er gestart worden met de bouw van de woningen. Deze werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd worden, dit betekent dat ook de woningen gefaseerd opgeleverd gaan worden. Bij oplevering van de woningen dient de omliggende openbare ruimte ingericht zijn.

Voordat de woningbouw start worden de faunaschermen verwijderd (hoofdstuk 4.4). Telkens als een deelgebied wordt vrijgegeven voor bebouwing, wordt dit deelgebied uit de schermen gehaald. Op deze wijze wordt het scherm gefaseerd verplaatst/verwijderd. Na het verwijderen zijn alleen nog de maatregelen ten aanzien van het broedseizoen en de Zorgplicht van toepassing (hoofdstuk 3.3).

Reikwijdte dit ecologisch werkprotocol

Zodra het bouwrijp maken is afgerond (riolering en tijdelijke bouwwegen gerealiseerd), worden de bouwvelden overgedragen aan de verschillende bouwende partijen. De werkzaamheden van de GEM zijn vanaf dat moment afgerond in de bouwvelden. Zodra de bouwvelden door de verschillende bouwende partijen in gebruik worden genomen zijn deze partijen zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Wet natuurbescherming en het invulling geven aan de Zorgplicht.

3 ALGEMENE MAATREGELEN EN VOORSCHRIFTEN

3.1 Algemeen

Algemeen:

- 1 het meest recente ecologisch werkprotocol (februari 2020), het ecologisch werkprotocol Bouwrijp maken, bouwen (9 december 2017) en de ontheffing RUD17.213991 met bijlagen, zijn altijd op het werk aanwezig en moet aan het bevoegd gezag getoond kunnen worden;
- 2 tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van de ontheffing en de bijbehorende brief op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren;
- 3 voor de werkzaamheden wordt conform de ontheffing een logboek bijgehouden dat eveneens op verzoek aan het bevoegd gezag kan worden getoond;
- 4 de uitvoerder is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de voorschriften uit het ecologisch werkprotocol;

- 5 de algemene zorgplicht uit de Wet natuurbescherming dient in acht te worden genomen. Medewerkers en derden die werken binnen het project worden actief voorgelicht over de inhoud van het werkprotocol en het handhaven van de zorgplicht;
- 6 voorafgaande aan de start van een deelproject (voorbelasten en bouwrijp maken) wordt de ecooloog geïnformeerd over de startdatum. Bij de startdatum wordt rekening gehouden met voldoende tijd om de noodzakelijke voorbereidingen uit te (laten) voeren;
- 7 uiterlijk één week voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het bevoegd gezag, via het elektronische formulier of via **5.1.2e**, geïnformeerd over de start werkzaamheden, een en ander conform de ontheffing;
- 8 voor afwijkingen van het werkprotocol of de ontheffing c.q. niet-verwachten gebeurtenissen, dient direct contact te worden opgenomen met het bevoegd gezag (**5.1.2e**), met de ecooloog ir. **5.1.2e** van Witteveen+Bos (**5.1.2e**) of tijdens afwezigheid van de heer **5.1.2e** met de heer **5.1.2e** (**5.1.2e**). De ecooloog kan een werk schriftelijk 'vrijgeven'. Dit document wordt toegevoegd aan de documenten die bij het project horen en overhandigd aan GEM Bloemendalerpolder CV;
- 9 calamiteiten worden door de uitvoerder per omgaand doorgegeven aan het bevoegd gezag, de opdrachtgever en zo nodig de ecooloog.

3.2 Meldingsplicht

Meldingsplicht:

- de ontheffingshouder dient minimaal één week van tevoren of zodra de datum waarop de werkzaamheden (faunaschermen plaatsen) zullen aanvangen bekend is:
 - hiervan elektronisch melding te maken bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord via het digitale meldformulier op de website van de RUD NHN). OF;
 - hiervan telefonisch melding te maken bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord op **5.1.2e**;
- de ontheffingshouder dient bij het plaatsen van een nieuw faunascherm of wanneer wijzigingen aan een reeds geplaatst scherm wordt aangebracht hiervan bij de afdeling toezicht en handhaving van Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord:
 - elektronisch melding te maken via **5.1.2e** @rudnhn.nl. OF;
 - telefonisch melding te maken op **5.1.2e**.

3.3 Algemene zorgplicht

De zorgplicht houdt in elk geval in dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten:

- dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel
- indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevegd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of
- voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.

Onderstaande maatregelen komen voort uit de Zorgplicht:

- iedereen die werkt binnen het project wordt geïnformeerd en geïnstrueerd over het werkprotocol en de algemene zorgplicht;
- voordat werkzaamheden starten dient de vegetatie in het gebied gefaseerd, in één richting en 10 centimeter boven het maaiveld te worden gemaaid opdat diersoorten de mogelijkheid krijgen om uit het gebied weg te trekken;
- bij de planning van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de broedperiode van vogelsoorten. Deze loopt globaal van maart tot en met augustus. Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kan deze periode langer dan wel korter zijn. De geschiktheid van de periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient te worden bepaald door een ecologisch deskundige;

- bij het dempen van watergangen dienen ook algemeen voorkomen soorten zoveel mogelijk te worden afgevangen en te worden overgeplaatst naar geschikt leefgebied.

4 BESCHERMDE AMFIBIESOORTEN (HEIKIKKER EN RUGSTREEPPAD)

Voordat het voorbelasten op een bouwveld aanvangt, dient een faunascherm rondom het betreffende bouwveld te worden aangebracht en dienen de in het betreffende bouwveld aanwezige amfibieën te worden afgevangen. De methodiek ten aanzien van het plaatsen van de schermen en het afvangen van de amfibieën wordt hieronder beschreven. De tijdens het afvangen toe te passen voorschriften ten aanzien van arbeids- en onderzoekshygiëne zijn opgenomen in bijlage I.

4.1 Plaatsen faunascherm

Voordat de voorbelasting van een nieuwe fase/bouwveld aanvangt, dienen grondgebonden faunasoorten zoals heikikker en rugstreeppad te worden afgevangen en verplaatst. Ten behoeve van het afvangen worden faunaschermen rondom de bouwvelden geplaatst. Onderstaande maatregelen worden hiervoor uitgevoerd:

- 1 voorafgaande aan het plaatsen van de faunaschermen wordt ter plaatse van het te plaatsen scherm het gras in een strook van 1 meter breedte kort afgemaaid;
- 2 per fase/bouwveld wordt het werkgebied uitgerasterd, conform het kennisdocument Rugstreeppad van de BIJ12 – '[...] dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van schermen van stevig plastic of worteldoek van 50 centimeter hoog en minimaal 10 centimeter ingegraven in de grond', met een afscherming die de dieren belemmert het terrein te betreden;
- 3 naast het afvangen langs de schermen, worden tevens vangkruizen geplaatst midden in de bouwvelden om het afvangen te versnellen. Alleen de vangkruizen worden weer verwijderd voordat het ophogen van het bouwveld start;
- 4 voor het afvangen worden langs de schermen schone emmers ingegraven, waarbij de emmers op een onderlinge afstand van 25 meter komen te staan. In deze emmers wordt - ter voorkoming van dode dieren - aas en dekking aangebracht;
- 5 in de actieve periode - maart/oktober - van de heikikker en de rugstreeppad worden de schermen minimaal één keer per week gecontroleerd op gebreken. De gebreken worden gerapporteerd en zo spoedig mogelijk gerepareerd. De controles worden opgenomen in het logboek;
- 6 op een strook van minimaal 50 centimeter langs de buitenzijde van het scherm moet de vegetatie kort gehouden worden, zodat de vegetatie niet over het scherm hangt;
- 7 wanneer exemplaren van de heikikker of de rugstreeppad worden aangetroffen binnen de afgeschermdede terreindelen wordt onmiddellijk gestart met de volgende maatregelen:
 - de emmers langs de schermen worden geopend en 2x per dag gecontroleerd door een ecologisch deskundige tot dat er 5 dagen niets meer wordt gevangen. De emmers worden direct verwijderd of afgedicht als er vijf dagen niets wordt gevangen;
 - tegelijkertijd worden zolang er nog dieren worden gevangen in de emmers iedere avond gedurende 2 uur het afgeschermdede terrein door ecologen afgezocht naar dieren. Aangetroffen dieren worden verplaatst naar het compensatiegebied;
 - tevens is er gedurende de periode dat er nog dieren worden gevangen in de emmers overdag permanent ecologische begeleiding aanwezig tijdens de werkzaamheden, zodat eventueel overdag verschijnende dieren kunnen worden afgevangen en verplaatst naar het compensatiegebied.

4.2 Afvangen dieren binnen de schermen

Nadat de schermen en vangkruizen zijn geplaatst kan het afvangen van kleine grondgebonden soorten worden uitgevoerd. Hiervoor worden de onderstaande werkwijze aangehouden:

- 1 voorafgaande aan de werkzaamheden (voorbelasten) worden de aanwezige dieren afgevangen en uitgezet in geschikt habitat ter plaatse van het compensatiegebied, bij voorkeur op een deel waar geen werkzaamheden zijn gepland;
- 2 in de maanden augustus en september kunnen rugstreeppad en heikikker worden afgevangen (waarbij de nachtvorst in het najaar c.q. het begin van de winterrust bepalend is voor de einddatum);
- 3 voor het afvangen moet minimaal één maand worden aangehouden;
- 4 de emmers worden tweemaal per dag nagelopen en geleegd;
- 5 het afvangen van de dieren wordt gestaakt als vijf dagen geen dieren meer worden gevangen, of de winterrust van de dieren is ingetreden;
- 6 het afvangen van exemplaren van de heikikker en rugstreeppad dient te worden bijgehouden in het logboek. Het logboek maakt onderdeel uit van de ontheffing en dient op verzoek direct te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.

4.3 Onderhoud faunaschermen

Zodra het voorbelasten en bouwrijp maken is gestart (nadat faunaschermen zijn geplaatst en voldoende inspanning is geleverd om dieren weg te vangen) moeten ten aanzien van de faunaschermen de navolgende voorschriften in acht worden genomen:

- 1 het scherm mag niet worden beschadigd, er mag niets tegen of over het scherm liggen;
- 2 de begroeiing langs het scherm moet regelmatig worden gemaaid;
- 3 zwerfvuil moet dagelijks worden verwijderd. Er mag geen losliggend materiaal achterblijven;
- 4 bij beschadiging van het faunascherm wordt onmiddellijk de ecoloog geïnformeerd en wordt de schade hersteld;
- 5 het scherm moet te allen tijde gesloten blijven – dat betekent dat de toegangspoort gesloten moet blijven of zo geconstrueerd dat er geen dieren kunnen binnenkomen via de poort.

4.4 Verwijderen faunaschermen

Nadat het voorbelasten is afgerond, de riolering en bouwwegen zijn aangelegd en het bouwrijp maken is afgerond, wordt door andere partijen dan de GEM Bloemendalerpolder CV gestart met de woningbouw. Wanneer de woningen in deze bouwvelden zijn afgebouwd, zullen deze gedeeltelijk al worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, waardoor de bouwvelden dus stukje bij beetje al worden bewoond en zodoende openbaar toegankelijk moeten worden gemaakt. **Alle faunaschermen direct grenzend aan het compensatiegebied blijven te allen tijde staan.** Op deze schermen blijft zolang bouwwerkzaamheden plaatsvinden ten behoeve van de woningbouw in Weespersluis de onderhoudsplicht van toepassing zodat beschermde soorten uit het compensatiegebied niet de openbare bouwvelden (waar plaatselijk nog wordt gewerkt) eenvoudig opnieuw kunnen bevolken. In afbeelding 4.1 is schematisch weergegeven hoe het verwijderen van de schermen plaatsvindt. Het in de tabel weergegeven overzicht betreft een voorbeeld van hoe het verplaatsen/verwijderen van de schermen zal plaatsvinden en is bedoeld om duidelijkheid te geven in de systematiek. Dit betreft dus geen weergave van de werkelijke situatie, aangezien de planning van de werkzaamheden in de verschillende bouwvelden kan afwijken van de in afbeelding 4.1 weergegeven planning (zie ook bijlage II).

Afbeelding 4.1 Schematische weergave van het gefaseerd verwijderen van het faunascherm

1. Integraal ruw bouwrijp maken fase 2 (huidige situatie)	2. Start bouwrijp maken fase 2A1 binnen de faunaschermen	3. Fase 2A1 wordt voorzien van aanvullende faunaschermen zodat dit gebied wordt gescheiden van de rest van fase 2. In fase 2A2 starten we met bouwrijp maken binnen de faunaschermen.
		
4. In fase 2A1 wordt gestart met de bouw van woningen, de faunaschermen richting fase 1 worden verwijderd (zuidzijde). Fase 2A2 wordt voorzien van aanvullende faunaschermen zodat dit gebied wordt gescheiden van de rest van fase 2. In fase 2B1 starten we met bouwrijp maken binnen de faunaschermen.	5. Het faunascherm tussen fase 2A1 en 2A2 wordt verwijderd. In fase 2A1 wordt woonrijp gemaakt en in fase 2A2 wordt gestart met het bouwen van de woningen. Tussen fase 2B1 en 2B2 wordt een faunascherm geplaatst en in fase 2B2 wordt gestart met het bouwrijp maken.	6. Het faunascherm tussen fase 2A1 en 2B1 wordt verwijderd, dit geldt ook voor het faunascherm richting fase 1 (ten zuiden van fase 2B1). Het scherm aan de westzijde wordt in stand gehouden (rode lijn) omdat dit scherm de afspiegeling vormt met het natuurcompensatiegebied.
		
7. Alle faunaschermen binnen fase 2 zijn verwijderd. De schermen rondom worden wel in stand gehouden, aan de westzijde vanwege de afspiegeling met het natuurcompensatiegebied en ten noorden en oosten omdat daar nog andere deelgebieden zijn die (ruw) bouwrijp gemaakt worden. In fase 2A1 en 2A2 zijn de woningen inmiddels opgeleverd en is openbare ruimte volledig ingericht. Fase 2B1 wordt woonrijp gemaakt, terwijl in fase 2B2 gestart is met de bouw van de woningen.	8. Fase 2B2 wordt woonrijp gemaakt, alle faunaschermen rondom worden in stand gehouden.	De woningen in fase 2 zijn opgeleverd en de openbare ruimte is ingericht. De faunaschermen rondom worden in stand gehouden ten behoeve van de afspiegeling met het natuurcompensatiegebied en omdat in omliggende gebieden nog (ruw) bouwrijp gemaakt wordt.
		

5 WATERGEBONDEN ORGANISMEN (VISSEN, PLATTE SCHIJFHOREN, AMFIBIEËN)

Bij werkzaamheden waarbij watergangen/ sloten worden vergraven of gedempt dienende onderstaande maatregelen worden uitgevoerd:

- 1 als eerste maatregel worden de te dempen sloten afgedamd, zo nodig worden de watergangen gecompartmenteerd in stroken van 50 meter lengte;
- 2 bij sloten met een goed ontwikkelde watervegetatie wordt met een hark of een kraan met open grijpbak de vegetatie verwijderd en elders in geschikte waterpartijen uitgezet, hiermee wordt de platte schijfhoren en zijn eieren overgezet buiten de invloedssfeer van de te dempen waterpartijen. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in de periode september - oktober (waarbij de nachtvorst in het najaar c.q. het begin van de winterrust, waarbij de slakken zich terugtrekken in het sapropelium, bepalend is voor

de einddatum). Het overzetten van vegetatie mag alleen plaatsvinden wanneer zeker is dat grote watervlavel hierbij niet wordt verspreid;

- 3 na deze maatregelen wordt het water weggepompt tot er ongeveer 10 centimeter staat in de sloten, waarbij het water en het sapropelium van vegetatierijke wateren wordt overgepompt naar geschikte watergangen. De geschikte watergangen worden aangewezen door de ecoloog, waarbij een voorkeur uitgaat naar nieuw gegraven watergangen;
- 4 met een schepnet worden alle waarneembare dieren gevangen en uitgezet in een sloot buiten de invloedssfeer van het werkgebied/in het compensatiegebied. Om meer zekerheid te krijgen over het eindresultaat wordt de procedure voor het vangen met een schepnet driemaal uitgevoerd;
- 5 de bagger wordt uit de sloten gehaald en uitgespreid op het land in dunne lagen. Het baggeren wordt begeleid door een ecoloog die onmiddellijk de aangetroffen dieren verwijderd en uitzet in een sloot buiten het plangebied;
- 6 de sloten worden gedempt door een richting uit te werken, waarbij voorkomen wordt dat er dieren worden opgesloten;
- 7 het baggeren en dempen wordt begeleid door een ecologisch deskundige persoon. De eerste dag worden instructies gegeven en wordt het werk continue begeleid. De daaropvolgende dagen worden steekproeven genomen die niet worden aangekondigd en ongeveer een uur per dag beslaan;
- 8 het droogvallen van nieuwe en bestaande watergangen moet worden voorkomen door ondiepe sloten uit te baggeren conform de gedragscode van de Unie van Waterschappen;
- 9 de ecoloog maakt van ieder werkbezoek een kort verslag dat wordt opgenomen in het logboek.

6 BROEDVOGELS

Gedurende de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels in en in de omgeving van het projectgebied. Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen. Voor de in en in de omgeving van het projectgebied te verwachten vogelsoorten kan dit plaatsvinden door werkzaamheden buiten de broedperiode van aanwezige soorten uit te voeren. Tevens kunnen voorbereidende maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat vogels tot broeden kunnen komen binnen het plangebied. Voor het broedseizoen kan geen standaardperiode wordt gehanteerd in het kader van de Wnb. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode.



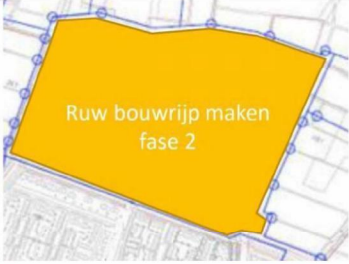
BIJLAGE: ARBEIDS- EN ONDERZOEKSHYGIËNE

Arbeids- en onderzoekshygiëne:

- als uw handen in contact komen met water of met amfibieën moeten wegwerphandschoenen (poederloos) worden gedragen. Nitril handschoenen (Eco Nitrile PF 250) worden aangeraden vanwege het afdodend effect op Bd en Bsal. Neem ook desinfecterende handgel (ongeparfumeerd) mee;
- alle materialen die tussen verschillende locaties gebruikt worden, moeten worden gedesinfecteerd;
- als u het water in bent gelopen, of contact hebt gemaakt met het water (of modder), moeten schoenen/laarzen/waadpak worden gedesinfecteerd;
- parkeer uw auto iets verderop op een verhard pad en niet op (zachte modderige) vegetatie;
- dode en/of zieke amfibieën zijn 'high risk'. Hanteer ze enkel met handschoenen, rapporteer zieke dieren en neem dode dieren mee (in dubbele plastic zak). Neem bij het aantreffen van dode salamanders direct contact op met RAVON en meld ook vondsten van ziek uitziende dieren (5.1.2e@ravon.nl of [@ravon.nl](https://twitter.com/5.1.2e));
- borstel plantenresten, modderkluiten, etc. af;
- spoel met water. Water uit een poel of vijver is prima. Zorg dat de materialen zo schoon mogelijk zijn;
- desinfecteer materialen op onderstaande manier, op ruime afstand van het oppervlaktewater en probeer geen, of zo min mogelijk residu in het milieu te laten komen. Gebruik bijvoorbeeld een emmer of bak om in te desinfecteren en voer de oplossing thuis op de voorgeschreven manier af;
- gebruik bij voorkeur 2 (of meer) sets materialen, zodat er geen chemicaliën gebruikt hoeven te worden in het veld;
- gebruik bij voorkeur Virkon S (1 % oplossing). Andere effectieve middelen zijn bleek (minimaal 1,6 % natriumhypochloriet), Nolvasan (0,75 % oplossing) en 70 % ethanol of spiritus (85 % ethanol). Gebruik altijd verse oplossingen;
- plaats de materialen in de oplossing of sproei de oplossing over de materialen. Laat de oplossing minimaal 5 minuten inwerken;
- spoel de materialen na desinfectie goed na met schoon (leiding)water;
- bent u niet in staat om uw materialen op de locatie schoon te maken, neem deze dan mee, van elkaar gescheiden in plastic zakken en doe het thuis;
- was uw handen met een desinfectans en/of desinfecteer uw handen met een ongeparfumeerde desinfecterende handgel, verkrijgbaar bij vrijwel alle supermarkten en drogisten.



BIJLAGE: SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN HET GEFASEERD VERWIJDEREN VAN HET FAUNASCHERM

1. Integraal ruw bouwrijp maken fase 2 (huidige situatie)	2. Start bouwrijp maken fase 2A1 binnen de faunaschermen	3. Fase 2A1 wordt voorzien van aanvullende faunaschermen zodat dit gebied wordt gescheiden van de rest van fase 2. In fase 2A2 starten we met bouwrijp maken binnen de faunaschermen.
		
4. In fase 2A1 wordt gestart met de bouw van woningen, de faunaschermen richting fase 1 worden verwijderd (zuidzijde). Fase 2A2 wordt voorzien van aanvullende faunaschermen zodat dit gebied wordt gescheiden van de rest van fase 2. In fase 2B1 starten we met bouwrijp maken binnen de faunaschermen.	5. Het faunasherm tussen fase 2A1 en 2A2 wordt verwijderd. In fase 2A1 wordt woonrijp gemaakt en in fase 2A2 wordt gestart met het bouwen van de woningen. Tussen fase 2B1 en 2B2 wordt een faunasherm geplaatst en in fase 2B2 wordt gestart met het bouwrijp maken.	6. Het faunasherm tussen fase 2A1 en 2B1 wordt verwijderd, dit geldt ook voor het faunasherm richting fase 1 (ten zuiden van fase 2B1). Het scherm aan de westzijde wordt in stand gehouden (rode lijn) omdat dit scherm de afscheiding vormt met het natuurcompensatiegebied.
		
7. Alle faunaschermen binnen fase 2 zijn verwijderd. De schermen rondom worden wel in stand gehouden, aan de westzijde vanwege de afscheiding met het natuurcompensatiegebied en ten noorden en oosten omdat daar nog andere deelgebieden zijn die (ruw) bouwrijp gemaakt worden. In fase 2A1 en 2A2 zijn de woningen inmiddels opgeleverd en is openbare ruimte volledig ingericht. Fase 2B1 wordt woonrijp gemaakt, terwijl in fase 2B2 gestart is met de bouw van de woningen.	8. Fase 2B2 wordt woonrijp gemaakt, alle faunaschermen rondom worden in stand gehouden.	De woningen in fase 2 zijn opgeleverd en de openbare ruimte is ingericht. De faunaschermen rondom worden in stand gehouden ten behoeve van de afscheiding met het natuurcompensatiegebied en omdat in omliggende gebieden nog (ruw) bouwrijp gemaakt wordt.
		
